

- 凡例(直轄施工箇所)**
- 令和6年度迄着手済箇所
  - 令和7年度施工予定箇所
  - 計画箇所(防波堤延伸事業)
  - 計画箇所(粘り強い化への改良)
- 整備進捗率(延長ベース)(R6d末時点)**
- 直轄事業: 約83%(延伸)  
: 約51%(粘り強い化)

- 凡例(高知県施工箇所)**
- 令和6年度迄着手済箇所
  - 令和7年度施工予定箇所
  - 計画箇所(防波堤延伸事業)
- 整備進捗率(延長ベース)(R6d末時点)**
- 高知県事業: 約47%(延伸)

本體工  
消波工  
被覆・根固工


腹付工

腹付工

上部工

基礎工

上部工  
消波工

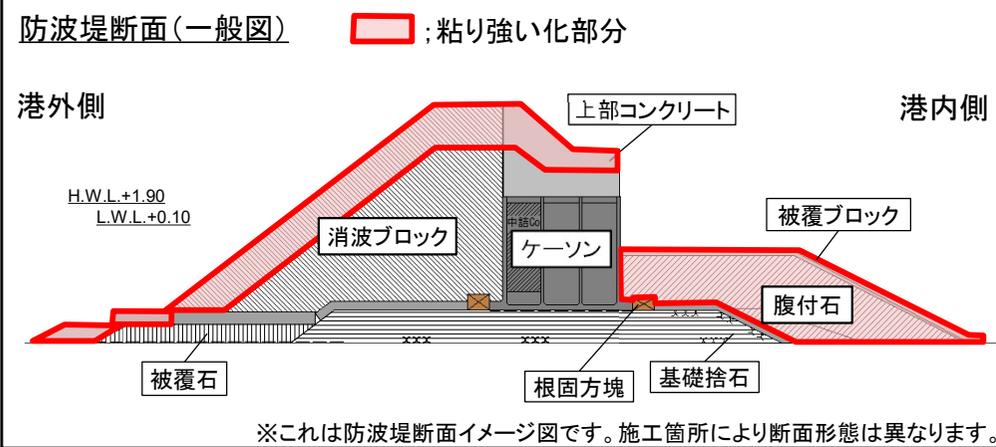

②防波堤(東第二)  
(高知県施工)  
本體工  
被覆・根固工  
(R7.2撮影)



①防波堤(東第一)(直轄施工)  
腹付工(R6.8撮影)



③防波堤(南)(直轄施工)  
本體工[ケーソン据付](R7.2撮影)



# (第2、3ライン) 高知港海岸 整備進捗状況(令和6年度末時点)

潮江地区 棧橋通工区 本体内(R7.3撮影)



さんぼしどおり  
棧橋通工区 L=約1000m  
R6d迄施工箇所 L=約745m

浦戸湾地区 横浜工区 本体内(R7.3撮影)



よこはま  
横浜工区 L=約2250m  
R6d迄施工箇所 L=約1245m

浦戸湾地区 瀬戸工区 本体内(R7.3撮影)



せと  
瀬戸工区 L=約350m  
R6d迄施工箇所 L=約117m

## 凡例(高知県施工箇所)


- : 令和6年度迄着手済箇所
- : 令和7年度施工予定箇所
- : 計画箇所

整備進捗率(延長ベース)  
高知県事業: 約36%(R6d末時点)

## 凡例(直轄施工箇所)

- : 令和6年度迄着手済箇所
- : 令和7年度施工予定箇所
- : 計画箇所

整備進捗率(延長ベース)  
直轄事業: 約12%(R6d末時点)

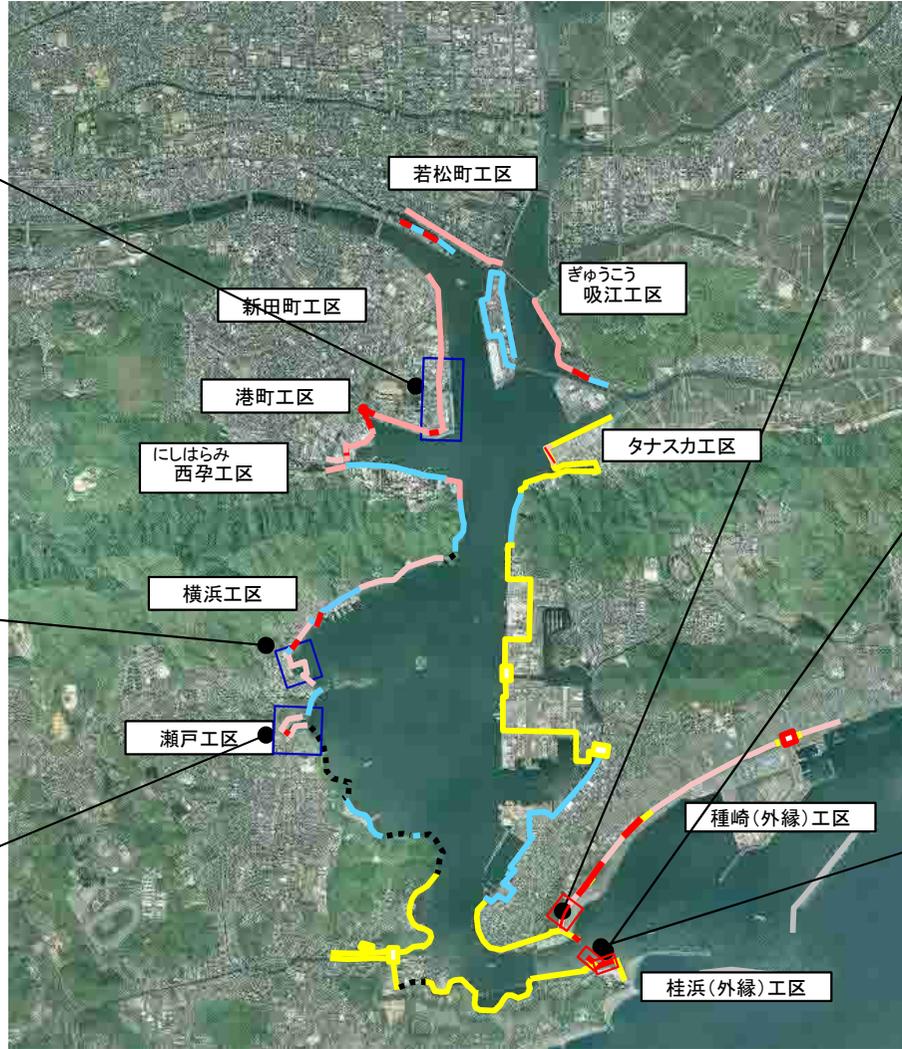

■■■ : 整備不要区間

種崎(外縁)工区 千松公園区間 本体内(R7.3撮影)




せんしょう  
千松公園区間 L=約350m  
R6d施工箇所 L=約50m

桂浜(外縁)工区 本体内(R7.3撮影)



桂浜(外縁)工区 L=約400m  
R6d施工箇所 L=約40m

津波防波堤(桂浜側) 堤頭部・堤幹部(R7.1撮影)

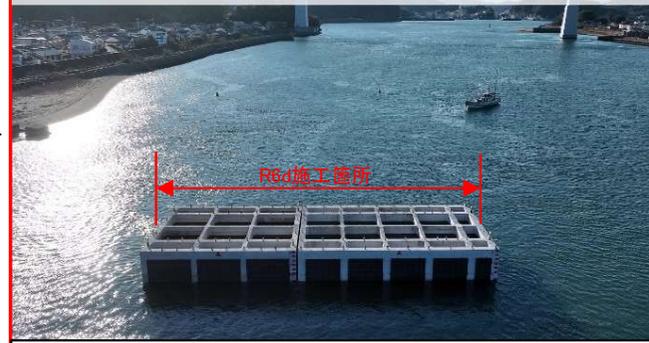

津波防波堤(桂浜側) L=約80m、R6d施工箇所 ケーソン2函据付  
津波防波堤(種崎側) L=約150m、R6d施工箇所 ケーソン4函製作仮置
