

凡例(直轄施工箇所)
 〇 : 令和7年度迄着手済箇所
 ■ : 令和8年度施工予定箇所
 ■ : 計画箇所(粘り強い化への改良)

整備進捗率(延長ベース)(R7d末時点)
 直轄事業: 約53%(粘り強い化)

凡例(高知県施工箇所)
 〇 : 令和7年度迄着手済箇所
 ■ : 令和8年度施工予定箇所
 ■ : 計画箇所(防波堤延伸事業)

整備進捗率(延長ベース)(R7d末時点)
 高知県事業: 約54%(延伸)

本體工
 消波工
 被覆・根固工

上部工


腹付工

基礎工
 被覆・根固工

上部工
 消波工

基礎工
 被覆・根固工

上部工
 消波工

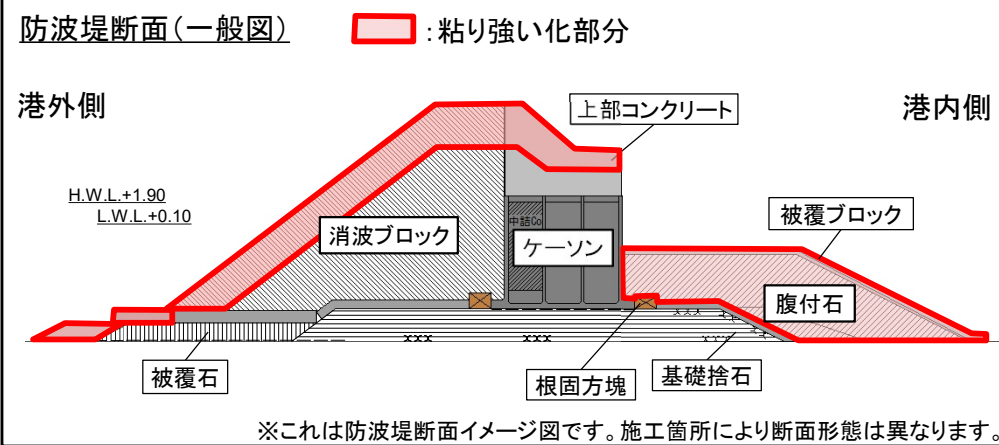

②防波堤(東第二)
 (高知県施工)
 本體工
 被覆・根固工
 (R8.1撮影)



①防波堤(東第一)(直轄施工)
 腹付工(R7.10撮影)



③防波堤(南)(直轄施工)
 上部工(R7.7撮影)



※防波堤(南)の延伸は通常時の港内静穏度確保を目的として実施

(第2、3ライン) 高知港海岸 整備進捗状況(令和7年度末時点)

潮江地区 棧橋通工区 本体外工(R8.3撮影)



浦戸湾地区 横浜工区 本体外工(R8.3撮影)



浦戸湾地区 瀬戸工区 本体外工(R8.3撮影)



凡例(高知県施工箇所)

- : 令和7年度迄着手済箇所
- : 令和8年度施工予定箇所
- : 計画箇所

整備進捗率(延長ベース)
高知県事業: 約45%(R7d末時点)

凡例(直轄施工箇所)

- : 令和7年度迄着手済箇所
- : 令和8年度施工予定箇所
- : 計画箇所

整備進捗率(延長ベース)
直轄事業: 約15%(R7d末時点)



種崎(外縁)工区 千松公園東区間 本体外工(R8.3撮影)



津波防波堤(種崎側) 本体外工(R8.1撮影)



津波防波堤(桂浜側) L=約80m、R7d施工箇所 基礎工
津波防波堤(種崎側) L=約150m、R7d施工箇所 ケーソン2函据付

桂浜(外縁)工区 本体外工(R8.1撮影)

